御嵩町橋梁長寿命化修繕計画

令和８年１１月

御　　嵩　　町

建 設 部　建 設 課

１．老朽化対策の基本方針

(1) 背　景

本町が管理する橋梁は、令和 5 年 3 月末現在 156 橋あり、今後、急速に老朽化橋梁の増加が見込まれるが、従来の事後保全型の維持管理を続けた場合、橋梁の修繕・更新等に要する費用が増大となることが懸念される。

(2) 目　的

アセットマネジメントの考え方を導入し、従来の「事後保全型の維持管理」から、定期点検により橋梁の状態を把握し、点検結果に基づく補修を計画的に行う「予防保全型の維持管理」に移行することで、橋梁の長寿命化を図り、維持管理及び更新費用等のライフサイクルコストの縮減を目指すとともに、道路ネットワークの安全性・信頼性の確保を図ることを目的とする。

(3) 基本方針

定期点検の点検結果により評価された健全性から修繕が必要な橋梁を選定した後、新技術を活用する等、ライフサイクルコストを含めた費用比較により適切な修繕方法又は更新を決定し、対策を実施する。

なお、定期点検の結果から、健全性Ⅲと評価された橋梁は、早期に対策が必要なため、速やかに修繕等を実施する。

また、道路利用者及び第三者への被害が懸念される損傷が発見された場合には、健全性に係わらず、速やかに修繕等を実施する。

(4) 計画期間

橋梁長寿命化修繕計画の計画期間は 10 年（令和 5 年度から令和 14 年度）とする。

(5) 管理橋梁の現況

本町が管理する道路施設の概要を表 1-1 に、道路橋の一覧を表 1-2 にそれぞれ示す。

表 1-1　本町が管理する道路施設の概要

道 路 施 設	現況（令和 4 年 3 月末現在）
道　　路	管理延長　　277.85 ㎞
道　路　橋	橋 梁 数　　156 橋
路　　線	路 線 数　　860 路線

表 1-2　本町が管理する道路橋の一覧表(1)

通番	橋　梁　名	路 線 名	橋長	幅員	形式	径間数
1	新川橋	千ノ井－真多羅線	32.0	16.8	PC橋	2
2	顔戸橋	川原野－南大桜線	56.0	5.0	RC橋	6
3	顔戸橋橋側歩道橋	川原野－南大桜線	56.0	2.1	PC橋	4
4	天王橋	田中－長谷線	28.4	8.2	鋼橋	1
5	門前橋	西之門－平芝線	54.6	12.8	PC橋	2
6	前沢橋	井尻－大久後線	39.0	8.2	PC橋	1
7	大洞橋	十五枚天王洞線	27.0	6.2	鋼橋	1
8	上河原橋	笹取－和口線	28.0	5.2	PC橋	2
9	送木橋	上之郷６号線	29.5	4.7	鋼橋	2
10	平芝橋	御嵩６０号線	51.9	5.2	鋼橋	2
11	木下橋	御嵩１２３号線	50.7	6.8	鋼橋	3
12	見上橋	中２７３号線	50.8	5.2	PC橋	3
13	欠橋	中２７４号線	50.3	4.3	鋼橋	3
14	美佐野高橋	上之郷９号線	17.0	6.1	RC橋	2
15	野崎橋	伏見１３５号線	57.0	4.1	PC橋	3
16	中切橋	上之郷７号線	39.3	5.2	PC橋	2
17	押山橋	上之郷１３８号線	19.0	11.0	PC橋	1
18	興亜橋	上之郷７８号線	25.2	5.2	鋼橋	1
19	自害谷橋	上之郷１３５号線	21.7	6.2	PC橋	1
20	金ヶ崎跨道橋	伏見２１８号線	33.9	4.9	PC橋	1
21	菰切橋	三反田－切木線	8.4	7.3	PC橋	1
22	日陰田１号橋	三反田－切木線	4.3	7.0	RC橋	1
23	日陰田２号橋	三反田－切木線	3.2	8.5	RC橋	1
24	西向田橋	三反田－切木線	7.3	8.0	PC橋	1
25	切木田橋	三反田－切木線	14.7	7.3	PC橋	1
26	芝作橋	田中－長谷線	3.2	7.8	RC橋	1
27	津橋高橋	道東－大洞線	12.0	7.7	PC橋	1
28	刎田１号橋	刎田－沼線	5.0	27.5	溝橋	1
29	東森下２号橋	刎田－沼線	5.0	11.8	溝橋	1
30	東森下１号橋	刎田－沼線	5.8	14.5	溝橋	1
31	中山２号橋	刎田－沼線	3.7	7.2	RC橋	1
32	藤之木２号橋	四十八－杉ヶ崎線	5.7	6.0	RC橋	1
33	鬼門坊橋	上之郷１号線	11.3	4.8	PC橋	1
34	打越橋	上之郷１号線	3.8	4.3	溝橋	1
35	小原橋	上之郷１４３号線	5.3	3.9	RC橋	1
36	中央橋	上之郷１４７号線	4.8	4.1	PC橋	1
37	新設未点検	上之郷３号線	9.2	4.2	PC橋	1
38	丸山橋	上之郷６号線	3.7	8.4	溝橋	1
39	下小澤橋	上之郷６号線	4.4	1.5	RC橋	1
40	道合１号橋	上之郷７号線	5.4	3.6	RC橋	1
41	鬼岩橋	上之郷１０号線	12.7	4.2	PC橋	1
42	烏帽子岩橋	上之郷１０号線	7.8	3.9	石橋	2
43	川上２号橋	上之郷１７号線	10.0	3.8	鋼橋	1
44	川上１号橋	上之郷１８号線	4.7	3.0	RC橋	1
45	田之頭橋	上之郷２１号線	3.1	4.6	RC橋	1
46	平橋	上之郷２２号線	8.3	3.4	PC橋	1
47	中島橋	上之郷３０号線	12.2	1.2	鋼橋	1
48	日陰橋	上之郷３４号線	10.8	3.5	PC橋	1
49	刎田３号橋	上之郷３５号線	11.0	1.2	鋼橋	1
50	日陰前２号橋	上之郷３８号線	4.4	5.3	RC橋	1

表 1-2　本町が管理する道路橋の一覧表(2)

通番	橋　梁　名	路 線 名	橋長	幅員	形式	径間数
51	日陰前１号橋	上之郷４０号線	4.1	4.5	RC橋	1
52	沼１号橋	上之郷４８号線	4.4	4.7	RC橋	1
53	中山１号橋	上之郷４９号線	3.7	4.4	RC橋	1
54	沼２号橋	上之郷５０号線	3.7	4.4	RC橋	1
55	向田橋	上之郷１４２号線	5.7	14.7	RC橋	1
56	小屋洞山橋	上之郷５９号線	3.3	2.3	RC橋	1
57	井之平橋	上之郷６６号線	3.6	8.2	RC橋	1
58	堂之前橋	上之郷６７号線	3.3	9.4	RC橋	1
59	次月橋	上之郷６９号線	10.3	6.1	RC橋	1
60	木屋洞橋	上之郷２０５号線	13.0	4.3	鋼橋	1
61	大平橋	上之郷７４号線	6.0	2.0	鋼橋	1
62	川原田橋	上之郷１８８号線	5.4	3.5	RC橋	1
63	西ノ前橋	上之郷９５号線	6.0	4.1	RC橋	1
64	井ノ上橋	上之郷１９０号線	6.2	3.0	RC橋	1
65	宮下橋	上之郷１０７号線	5.7	3.7	RC橋	1
66	下平田橋	上之郷１２９号線	10.7	4.6	PC橋	1
67	平田橋	上之郷１３１号線	3.3	4.8	RC橋	1
68	岩谷洞橋	上之郷７３号線	6.2	4.6	RC橋	1
69	道合２号橋	上之郷１８３号線	2.5	5.6	溝橋	1
70	道合３号橋	上之郷１８０号線	3.8	4.8	RC橋	1
71	向田１号橋	上之郷１６７号線	4.5	4.5	RC橋	1
72	宮下橋	上之郷１９４号線	6.3	5.0	PC橋	1
73	鳥取２号橋	上之郷２１２号線	7.0	4.8	RC橋	1
74	渡瀬橋	田中－長谷線	3.9	5.4	RC橋	1
75	長谷２号橋	尼ヶ池－長谷線	3.4	10.0	溝橋	1
76	四十八橋	四十八－杉ヶ崎線	2.3	9.0	溝橋	1
77	栢森橋	栢森－板良線	4.5	5.3	RC橋	1
78	萩田橋	御嵩１号線	2.2	7.1	溝橋	1
79	唐沢橋	御嵩１号線	7.3	5.8	溝橋	1
80	丹所橋	御嵩４４号線	8.0	1.3	鋼橋	1
81	長谷３号橋	御嵩６０号線	10.5	4.7	PC橋	1
82	平芝２号橋	御嵩６２号線	6.3	4.6	RC橋	1
83	平芝１号橋	御嵩６３号線	11.2	5.2	PC橋	1
84	板良橋	御嵩６４号線	10.4	4.7	PC橋	1
85	千ノ井橋	御嵩８５号線	2.9	5.0	溝橋	1
86	飛田橋	御嵩９２号線	2.7	4.3	RC橋	1
87	末国１号橋	御嵩９４号線	4.5	4.2	RC橋	1
88	末国２号橋	御嵩９４号線	2.5	6.5	RC橋	1
89	末国４号橋	御嵩９５号線	2.2	3.2	RC橋	1
90	南町１号橋	御嵩１０１号線	7.0	6.6	RC橋	1
91	末国３号橋	御嵩１０２号線	8.5	4.9	PC橋	1
92	末国５号橋	御嵩１０２号線	2.6	4.4	RC橋	1
93	南田１号橋	御嵩１０５号線	6.0	4.3	RC橋	1
94	南町２号橋	御嵩１０９号線	3.3	7.6	RC橋	1
95	北町４号橋	御嵩１１２号線	2.4	1.9	鋼橋	1
96	南田３号橋	御嵩１１５号線	5.8	3.8	RC橋	1
97	大西１号橋	御嵩１１９号線	6.4	2.7	RC橋	1
98	南田２号橋	御嵩１２５号線	7.1	3.3	RC橋	1
99	南田４号橋	御嵩１２５号線	5.9	2.7	鋼橋	1
100	南町４号橋	御嵩１２５号線	8.4	4.0	PC橋	1

表 1-2　本町が管理する道路橋の一覧表(3)

通番	橋 梁 名	路 線 名	橋長	幅員	形式	径間数
101	北町１号橋	御嵩１２８号線	9.0	2.3	PC橋	1
102	丹所上橋	四万堂－大西線	10.1	8.5	PC橋	1
103	平芝３号橋	西之門－平芝線	14.8	14.0	PC橋	1
104	東陶橋	御嵩１５５号線	9.4	10.2	PC橋	1
105	柳澤１号橋	柳澤－青木線	8.3	8.2	PC橋	1
106	柳澤２号橋	柳澤－青木線	4.0	7.5	溝橋	1
107	新木野２号橋	柳澤－長瀬洞線	7.0	13.2	溝橋	1
108	佐渡橋	中１９号線	2.9	4.6	溝橋	1
109	大庭橋	中２８号線	9.9	5.2	PC橋	1
110	大庭前２号橋	中２９号線	8.4	4.5	PC橋	1
111	真名田洞橋	中５９号線	2.4	8.4	RC橋	1
112	大庭前１号橋	中８１号線	2.7	3.4	RC橋	1
113	柳澤３号橋	中８９号線	8.4	4.5	PC橋	1
114	柳澤４号橋	中８９号線	3.5	4.4	RC橋	1
115	柳澤５号橋	中９０号線	3.5	4.4	RC橋	1
116	新木野1号橋	中９２号線	3.0	4.3	RC橋	1
117	長瀬洞１号橋	中９９号線	2.6	3.1	溝橋	1
118	藤塚橋	中１００号線	3.4	5.8	RC橋	1
119	新木野３号橋	中１０４号線	4.7	4.4	RC橋	1
120	大西２号橋	中１１５号線	9.4	1.9	鋼橋	1
121	社宮司１号橋	中１３８号線	3.2	4.0	溝橋	1
122	社宮司２号橋	中１４０号線	2.3	5.8	溝橋	1
123	西田橋	中１６５号線	3.3	4.8	RC橋	1
124	上地円１号橋	中１７１号線	6.1	3.6	PC橋	1
125	中地円橋	中１７３号線	9.8	5.6	PC橋	1
126	出合橋	中１７７号線	6.9	3.3	鋼橋	1
127	一本木橋	中２４４号線	2.3	6.0	溝橋	1
128	奥田橋	中１８６号線	2.9	3.6	RC橋	1
129	北屋敷４号橋	中１９２号線	3.2	15.5	溝橋	1
130	東洞１号橋	中１９３号線	3.3	3.4	溝橋	1
131	北屋敷３号橋	中２７６号線	3.3	5.0	溝橋	1
132	大王寺1号橋	中１９５号線	2.1	4.1	溝橋	1
133	東洞２号橋	中１９５号線	2.8	4.0	溝橋	1
134	大王寺２号橋	中２００号線	3.1	4.5	RC橋	1
135	大王寺３号橋	中２０１号線	4.5	4.8	RC橋	1
136	北屋敷１号橋	中２０３号線	3.2	9.0	溝橋	1
137	北屋敷２号橋	中２０４号線	3.1	7.0	溝橋	1
138	ヒラン橋	中２５３号線	4.0	4.2	RC橋	1
139	涯下橋	柳澤－青木線	12.3	7.9	PC橋	1
140	栗ヶ坪橋	笠田－杉ヶ洞線	5.8	3.5	RC橋	1
141	欠ノ下橋	笠田－杉ヶ洞線	5.0	4.2	鋼橋	1
142	土橋	伏見１号線	9.5	7.2	PC橋	1
143	階子田１号橋	伏見１９２号線	7.8	13.3	PC橋	1
144	大坪橋	伏見３号線	3.3	10.5	溝橋	1
145	白山橋	伏見２２号線	7.2	3.8	鋼橋	1
146	赤根橋	伏見２４号線	8.2	3.8	鋼橋	1
147	下洞橋	伏見２７号線	4.7	3.7	PC橋	1
148	坂本橋	伏見３０号線	9.2	3.4	RC橋	1
149	金ヶ崎橋	伏見３９号線	12.5	5.2	PC橋	1
150	樋角橋	伏見４０号線	9.4	3.7	PC橋	1
151	東坂下１号橋	伏見６９号線	2.2	7.5	溝橋	1
152	横枕橋	伏見７３号線	9.7	4.8	PC橋	1
153	岩崎２号橋	伏見７７号線	3.9	6.0	RC橋	1
154	東柿外戸橋	伏見７８号線	2.6	9.0	溝橋	1
155	大洞１号橋	伏見２００号線	4.0	3.9	溝橋	1
156	階子田２号橋	伏見１９２号線	6.6	10.2	PC橋	1

＜橋種別箇所数及び割合＞

- ✓ コンクリート桁の橋梁（RC 橋、PC 橋、溝橋）が 86%、鋼桁の橋梁が 13%である。
- ✓ 平均橋長は、RC 構造の橋梁が約 5m、PC 橋が約 17m、鋼橋が約 18mである。

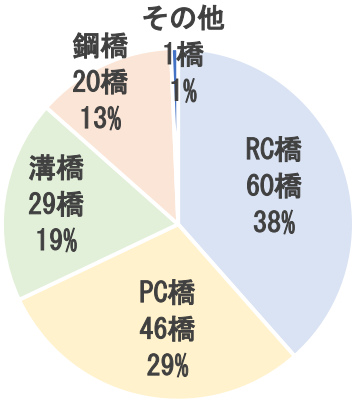


図 1-1　本町の橋種別箇所数及び割合



RC 橋（美佐野高橋）



PC 橋（野崎橋）



溝橋（新木野 2 号橋）



鋼橋（木下橋）

２．点　検

(1) 橋梁点検の種類

橋梁点検は、日常点検、初期点検、定期点検、臨時点検、調査・監視等を含んだ総称であるが、本計画は定期点検を対象とし、「岐阜県橋梁点検マニュアル」に基づき実施する。

表 2-1　橋梁点検の種類

点　　検	内　　容
日 常 点 検	日々の道路パトロールにより、路面や防護柵の損傷を発見し、直ちに応急的な修繕を実施する。
初 期 点 検	竣工（新設工事）後の適切な時期に実施し、初期に発生する劣化の進行を防止する。
定 期 点 検	原則 5 年に 1 回の頻度で定期的に実施し、損傷や劣化を観て健全性を診断する。
臨 時 点 検	特定の問題に対して臨時的に実施し、日常点検や定期点検の内容を補足する。
調　　査	設計を実施するために必要となる情報を収集する。
監　　視	対策を実施するまでの期間、道路橋の管理への活用を予定し予め決めた箇所の挙動等を追跡的かつ定量的に把握する。

(2) 定期点検

老朽化した橋梁について、定期的に橋梁点検を実施することで、早期に劣化や損傷に伴って発生する問題を発見し、予防保全の考え方で計画的に維持管理して、橋梁の長寿命化を図ること、また、老朽化により問題となるコンクリート片の落下による第三者被害を予防することを目的に実施する。

近接目視による点検状況





３．健全性評価

(1) 健全性評価方法

道路橋毎の健全性は、部材単位の診断結果を踏まえて、道路橋毎で総合的に判定されるが、一般的には、構造物の機能に影響を及ぼす主要な部材に着目して、最も厳しい評価で代表させることができる。

(2) 健全性評価

健全性の診断は表 3-1 の区分によって行う。

表 3-1　判定区分

区　　分		状　　態
Ⅰ	健全	道路橋の機能に支障が生じていない状態
Ⅱ	予防保全段階	道路橋の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態
Ⅲ	早期措置段階	道路橋の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態
Ⅳ	緊急措置段階	道路橋の機能に支障が生じている、または生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態

(3) 老朽化の状況

定期点検の診断結果を図 3-1 に示す。

健全性Ⅰの橋梁が 72%、健全性Ⅱの橋梁が 28%である。

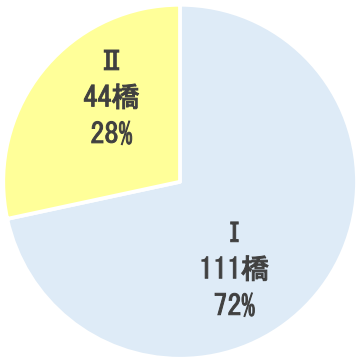


図 3-1　本町の健全性診断結果

４．対策の優先順位の考え方

⑴ 補修の優先順位付け

点検結果に基づき、効果的な維持及び修繕が図れるよう必要な措置を講じる。

対策の優先順位は、損傷の程度や損傷位置から診断される施設の健全性の他、迂回路の有無や路線の重要度、第三者への影響等を総合的に判断して決定する。

５．新技術の活用方針

⑴ 方　針

維持管理に係わるコスト縮減等に取り組むため、すべての橋梁で「岐阜県点検支援技術活用の手引き」や国土交通省の「点検支援技術性能カタログ」に記載されている新技術、新技術情報提供システム（NETIS）の登録技術等の活用を検討し、コスト縮減を図る。

⑵ 目　標

令和 11 年度(定期点検３巡目最終年度)までの橋梁点検において 20 橋を対象にドローンなどの新技術を活用し、総額約 100 万円のコスト縮減を目指す。

点検結果により修繕が必要になった際にも新技術の活用を検討して費用の削減に努める。

６．費用縮減に関する具体的な方針

⑴ 方　針

1.1 予防保全型の維持管理への移行

事後保全型の維持管理から予防保全型の維持管理に移行することにより、中長期的な修繕費用の削減を図る。

1.2 集約化・撤去、機能縮小

社会経済情勢や施設の利用状況等の変化に応じた適正な配置のための集約化・撤去、機能縮小を適宜検討する。

⑵ 目　標

2.1 予防保全型の維持管理への移行

50 年間の橋梁維持管理を、事後保全型から予防保全型に移行し、橋梁の長寿命化を図ることにより、約 29%（約 7 億 4 千万円）のコスト縮減を図る。


また、年度毎の維持管理費用を平準化させることで、財政への集中的な負担を軽減する。なお、この維持管理費用の算出は令和 4 年度までの点検結果に基づき検討したものであり、今後は最新の知見、点検結果等に基づいて見直しを行い、実態を踏まえた最適な計画に更新していく。


2.2 集約化・撤去、機能縮小


迂回路が存在し集約が可能な橋梁について、令和 10 年度までに検討・調整を行い、

2 橋について撤去し、維持管理費用約 100 万円のコスト縮減を目指す。

点検実施数	判定区分			
	Ⅰ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅳ
156	111	44	1	0

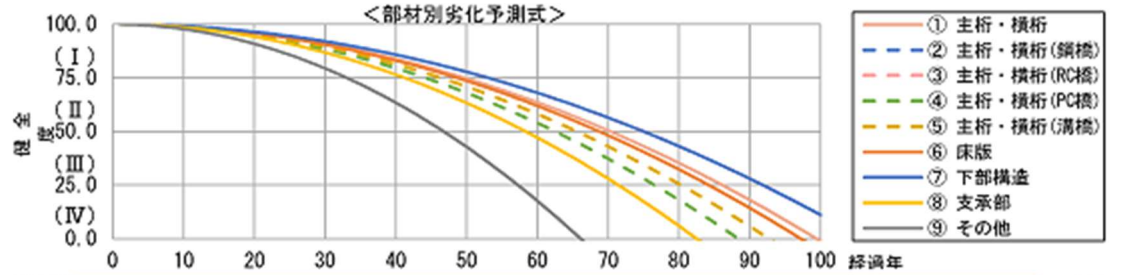

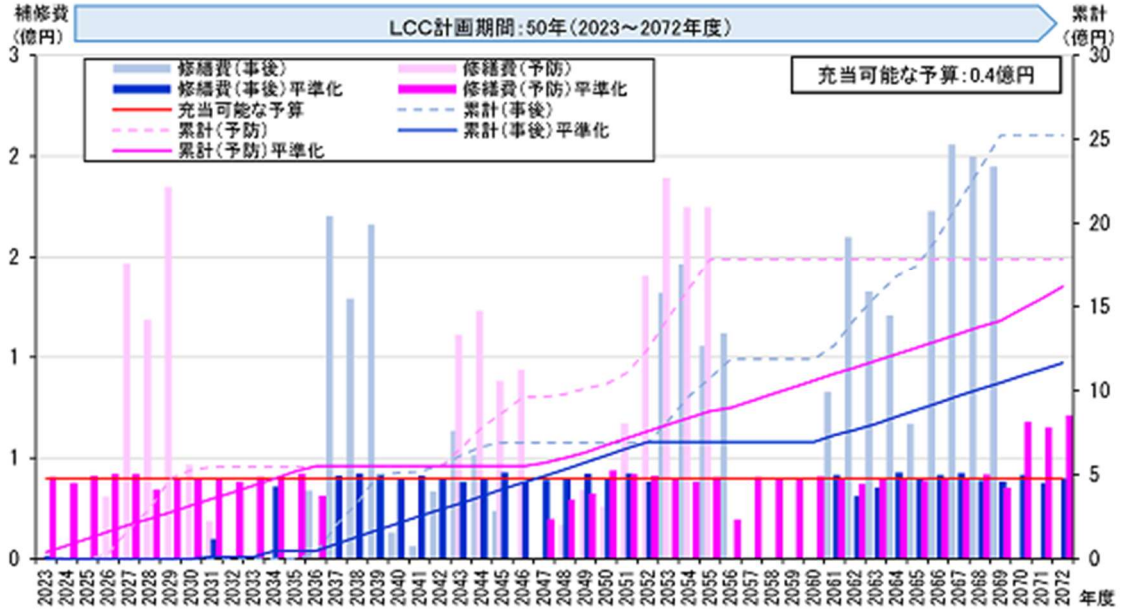

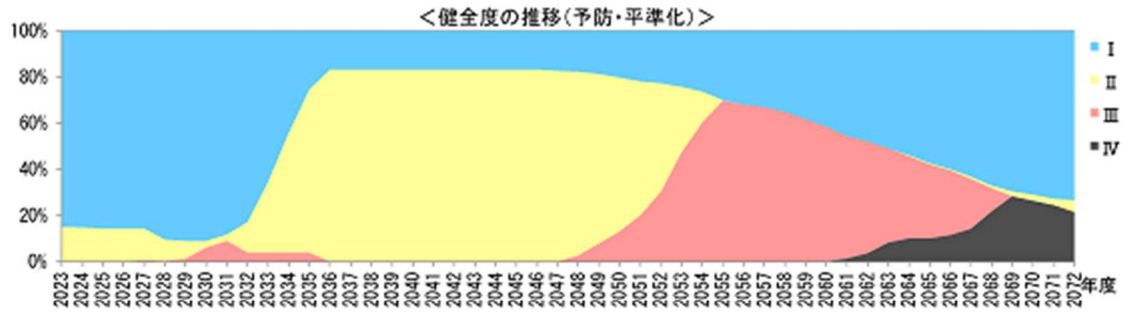

＜管理方法別修繕費用合計＞

百万円

	2023～2032	2033～2042	2043～2052	2053～2062	2063～2072	合計
事後保全型管理	1	552	139	739	1,093	2,524
予防保全型管理	548	0	700	539	1	1,788
予防平準化実施	395	155	209	378	482	1,619

	事後保全型管理	予防保全型管理	削減率	予防平準化実施
平均修繕費	0.5億円/年	0.4億円/年	29%	0.3億円/年

７．フォローアップ

定期点検等の実施により新たに発見された損傷については、その優先順位を考慮し、適宜個別施設計画の見直し（フォローアップ）を行う。

８．個別の構造物毎の事項

定期点検後の健全性評価、劣化予測、ライフサイクルコストの算定、対策優先順位等を踏まえた当町の長寿命化修繕計画【個別施設計画】を別表に示す。

１５ｍ以上橋梁の個別施設計画（計画期間は令和5年度より10年間）

令和７年７月更新

橋梁ID	橋梁名	町道路線名	架設年度	橋長（m）	幅員（m）	径間	健全性判定	法定点検計画										補修計画（調査設計は○、施工は●で表示）										対策内容	対策費用
								R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14		
2948	新川橋	千ノ井－真多羅線	2001	32.0	16.8	2	I	○					○																—
2949	顔戸橋	川原野－南大桜線	1963	56.0	5.0	6	II				○					○						○	●					修繕	１５百万円
2949	顔戸橋橋側歩道橋	川原野－南大桜線	不明	56.0	2.1	4	II				○					○						○	●					修繕	４百万円
2950	天王橋	田中－長谷線	1995	28.4	8.2	1	I	○					○																—
2951	門前橋	西之門－平芝線	1989	54.6	12.8	2	I			○						○													—
2952	前沢橋	井尻－大久後線	2008	39.0	8.2	1	I					○					○												—
2953	大洞橋	十五枚天王洞線	1997	27.0	6.2	1	I					○					○												—
2954	上河原橋	笹取－和口線	1993	28.0	5.2	2	I				○					○													—
2955	送木橋	上之郷６号線	1997	29.5	4.7	2	II	○					○					●										修繕	３０百万円
2956	平芝橋	御嵩６０号線	1981	51.9	5.2	2	II					○					○		○	●	●							修繕	２４百万円
2957	木下橋	御嵩１２３号線	1973	50.7	6.8	3	I	○		○																			—
2958	見上橋	中２７３号線	1959	50.8	5.2	3	II		○					○				○	●									修繕	７百万円
2959	欠橋	中２７４号線	1972	50.3	4.3	3	II	○					○							○	●	●						修繕	２０百万円
2960	美佐野高橋	上之郷９号線	1952	17.0	6.1	2	I			○					○														—
2961	野崎橋	伏見１３５号線	1985	57.0	4.1	3	I			○					○														—
2962	中切橋	上之郷７号線	1991	39.3	5.2	2	I		○					○															—
2963	押山橋	上之郷１３８号線	1996	19.0	11.0	1	I		○					○															—
2964	興亜橋	上之郷７８号線	1999	25.2	5.2	1	II		○					○															
2965	自害谷橋	上之郷１３５号線	1984	21.7	6.2	1	I			○					○														—
2966	金ヶ崎跨道橋	伏見２１８号線	2004	33.9	4.9	1	I			○					○														—
	15m以上	20橋						5	4	6	3	3	4	4	4	4	3												

１５m未満橋梁の個別施設計画（計画期間は令和5年度より10年間）

令和７年７月更新

橋梁ID	橋梁名	町道路線名	架設年度	橋長（m）	幅員（m）	径間	健全性判定	法定点検計画										補修計画（調査設計は○、施工は●で表示）										対策内容	対策費用
								R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14		
15094	菰切橋	三反田－切木線	不明	8.4	7.3	1	II	○					○															修繕	3百万円
15095	日陰田１号橋	三反田－切木線	不明	4.3	7.0	1	II		○					○														修繕	6百万円
15096	日陰田２号橋	三反田－切木線	不明	3.2	8.5	1	I		○					○															―
15097	西向田橋	三反田－切木線	不明	7.3	8.0	1	II	○					○															修繕	7百万円
15098	切木田橋	三反田－切木線	1972	14.7	7.3	1	II	○					○															修繕	4百万円
15099	芝作橋	田中－長谷線	不明	3.2	7.8	1	I	○					○																―
15100	津橋高橋	道東－大洞線	1987	12.0	7.7	1	I					○					○												―
15101	刎田１号橋	刎田－沼線	1997	5.0	27.5	1	I		○					○															―
15102	東森下２号橋	刎田－沼線	不明	5.0	11.8	1	I	○					○																―
15103	東森下１号橋	刎田－沼線	不明	5.8	14.5	1	I		○					○															―
15104	中山２号橋	刎田－沼線	不明	3.7	7.2	1	I		○					○															―
15105	藤之木２号橋	四十八－杉ヶ崎線	不明	5.7	6.0	1	I		○					○							○	●						修繕	3百万円
15106	鬼門坊橋	上之郷１号線	1987	11.3	4.8	1	I		○					○															―
15107	打越橋	上之郷１号線	不明	3.8	4.3	1	I		○					○															―
15108	小原橋	上之郷１４３号線	不明	5.3	3.9	1	I		○					○															―
15109	中央橋	上之郷１４７号線	不明	4.8	4.1	1	II		○					○														修繕	6百万円
15110	藤之木１号橋	上之郷３号線	2020	9.2	4.2	1		○					○																―
15111	丸山橋	上之郷６号線	不明	3.7	8.4	1	I	○					○																―
15112	下小澤橋	上之郷６号線	1988	4.4	1.5	1	I					○					○												―
15113	道合１号橋	上之郷７号線	不明	5.4	3.6	1	II		○					○														修繕	5百万円
15114	鬼岩橋	上之郷１０号線	1959	12.7	4.2	1	I					○					○												―
15115	烏帽子岩橋	上之郷１０号線	不明	7.8	3.9	2	I					○					○												―
15116	川上２号橋	上之郷１７号線	不明	10.0	3.8	1	II					○					○											修繕	6百万円
15117	川上１号橋	上之郷１８号線	不明	4.7	3.0	1	I		○					○															―
15118	田之頭橋	上之郷２１号線	不明	3.1	4.6	1	II	○					○															修繕	5百万円
15119	平橋	上之郷２２号線	不明	8.3	3.4	1	I	○					○																―
15120	中島橋	上之郷３０号線	不明	12.2	1.2	1	I	○					○																―
15121	日陰橋	上之郷３４号線	不明	10.8	3.5	1	II				○					○												修繕	5百万円
15122	刎田３号橋	上之郷３５号線	不明	11.0	1.2	1	I					○					○												―
15123	日陰前２号橋	上之郷３８号線	不明	4.4	5.3	1	I	○					○																―
15124	日陰前１号橋	上之郷４０号線	不明	4.1	4.5	1	I	○					○																―
15125	沼１号橋	上之郷４８号線	不明	4.4	4.7	1	I	○					○																―
15126	中山１号橋	上之郷４９号線	不明	3.7	4.4	1	I	○					○																―
15127	沼２号橋	上之郷５０号線	不明	3.7	4.4	1	I	○					○																―
15128	向田橋	上之郷１４２号線	1985	5.7	14.7	1	I	○					○																―
15129	小屋洞山橋	上之郷５９号線	不明	3.3	2.3	1	I					○					○												―
15130	井之平橋	上之郷６６号線	不明	3.6	8.2	1	I					○					○												―
15131	堂之前橋	上之郷６７号線	不明	3.3	9.4	1	I					○					○												―
15132	次月橋	上之郷６９号線	1953	10.3	6.1	1	II					○					○											修繕	6百万円
15133	木屋洞橋	上之郷２０５号線	不明	13.0	4.3	1	I	○					○																―
15134	大平橋	上之郷７４号線	不明	6.0	2.0	1	II		○					○														修繕	6百万円
15135	川原田橋	上之郷１８８号線	不明	5.4	3.5	1	II		○					○														修繕	4百万円

１５m未満橋梁の個別施設計画（計画期間は令和5年度より10年間）

令和７年７月更新

橋梁ID	橋梁名	町道路線名	架設年度	橋長（m）	幅員（m）	径間	健全性判定	法定点検計画										補修計画（調査設計は○、施工は●で表示）										対策内容	対策費用
								R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14		
15136	西ノ前橋	上之郷９５号線	不明	6.0	4.1	1	II		○					○														修繕	6百万円
15137	井ノ上橋	上之郷１９０号線	不明	6.2	3.0	1	I		○					○															—
15138	宮下橋	上之郷１０７号線	不明	5.7	3.7	1	I				○					○											○	撤去	5百万円
15140	下平田橋	上之郷１２９号線	1992	10.7	4.6	1	I		○					○															—
15141	平田橋	上之郷１３１号線	不明	3.3	4.8	1	I		○					○															—
15142	岩谷洞橋	上之郷７３号線	1985	6.2	4.6	1	I		○					○															—
15143	道合２号橋	上之郷１８３号線	不明	2.5	5.6	1	I	○					○																—
15144	道合３号橋	上之郷１８０号線	不明	3.8	4.8	1	I		○					○															—
15145	向田１号橋	上之郷１６７号線	不明	4.5	4.5	1	II		○					○														修繕	4百万円
15146	宮下橋	上之郷１９４号線	1980	6.3	5.0	1	I				○					○											○	撤去	5百万円
15147	鳥取２号橋	上之郷２１２号線	不明	7.0	4.8	1	I		○					○															—
15149	渡瀬橋	田中－長谷線	不明	3.9	5.4	1	I	○					○																—
15150	長谷２号橋	尼ヶ池－長谷線	不明	3.4	10.0	1	I	○					○																—
15151	四十八橋	四十八－杉ヶ崎線	不明	2.3	9.0	1	I		○					○															—
15152	栢森橋	栢森－板良線	不明	4.5	5.3	1	II		○					○														修繕	4百万円
15153	萩田橋	御嵩１号線	不明	2.2	7.1	1	I	○					○																—
15154	唐沢橋	御嵩１号線	2012	7.3	5.8	1	I	○					○																—
15155	丹所橋	御嵩４４号線	不明	8.0	1.3	1	I		○					○														修繕	2百万円
15156	長谷３号橋	御嵩６０号線	不明	10.5	4.7	1	I	○					○																—
15157	平芝２号橋	御嵩６２号線	不明	6.3	4.6	1	II			○					○													修繕	4百万円
15158	平芝１号橋	御嵩６３号線	2002	11.2	5.2	1	I			○					○														—
15159	板良橋	御嵩６４号線	不明	10.4	4.7	1	I		○					○															—
15160	千ノ井橋	御嵩８５号線	不明	2.9	5.0	1	I			○					○														—
15161	飛田橋	御嵩９２号線	不明	2.7	4.3	1	II			○					○													修繕	4百万円
15162	末国１号橋	御嵩９４号線	不明	4.5	4.2	1	I			○					○														—
15163	末国２号橋	御嵩９４号線	不明	2.5	6.5	1	I			○					○														—
15164	末国４号橋	御嵩９５号線	不明	2.2	3.2	1	I			○					○														—
15165	南町１号橋	御嵩１０１号線	不明	7.0	6.6	1	II			○					○													修繕	4百万円
15166	末国３号橋	御嵩１０２号線	不明	8.5	4.9	1	I			○					○														—
15167	末国５号橋	御嵩１０２号線	不明	2.6	4.4	1	I			○					○														—
15168	南田１号橋	御嵩１０５号線	不明	6.0	4.3	1	II			○					○													修繕	4百万円
15169	南町２号橋	御嵩１０９号線	不明	3.3	7.6	1	I			○					○														—
15170	北町４号橋	御嵩１１２号線	不明	2.4	1.9	1	I			○					○														—
15171	南田３号橋	御嵩１１５号線	不明	5.8	3.8	1	II			○						○												修繕	4百万円
15172	大西１号橋	御嵩１１９号線	不明	6.4	2.7	1	II			○						○												修繕	4百万円
15173	南田２号橋	御嵩１２５号線	不明	7.1	3.3	1	II			○						○												修繕	6百万円
15174	南田４号橋	御嵩１２５号線	不明	5.9	2.7	1	II	○		○							○											修繕	6百万円
15175	南町４号橋	御嵩１２５号線	不明	8.4	4.0	1	I			○						○													—
15176	北町１号橋	御嵩１２８号線	2012	9.0	2.3	1	I			○						○													—
15177	丹所上橋	四万堂－大西線	不明	10.1	8.5	1	I			○						○													—
15178	平芝３号橋	西之門－平芝線	1989	14.8	14.0	1	I					○					○												—
15179	東陶橋	御嵩１５５号線	不明	9.4	10.2	1	I			○						○													—

１５m未満橋梁の個別施設計画（計画期間は令和5年度より10年間）

令和７年７月更新

橋梁ID	橋梁名	町道路線名	架設年度	橋長（m）	幅員（m）	径間	健全性判定	法定点検計画										補修計画（調査設計は○、施工は●で表示）										対策内容	対策費用
								R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14		
15180	柳澤１号橋	柳澤－青木線	不明	8.3	8.2	1	I			○						○													—
15181	柳澤２号橋	柳澤－青木線	不明	4.0	7.5	1	I	○					○																—
15182	新木野２号橋	柳澤－長瀬洞線	不明	7.0	13.2	1	II			○						○												修繕	7百万円
15183	佐渡橋	中１９号線	不明	2.9	4.6	1	II	○					○															修繕	5百万円
15184	大庭橋	中２８号線	1990	9.9	5.2	1	I			○						○													—
15185	大庭前２号橋	中２９号線	不明	8.4	4.5	1	II			○						○												修繕	4百万円
15186	真名田洞橋	中５９号線	不明	2.4	8.4	1	I	○					○																—
15187	大庭前１号橋	中８１号線	不明	2.7	3.4	1	II			○						○												修繕	7百万円
15188	柳澤３号橋	中８９号線	不明	8.4	4.5	1	I			○						○													—
15189	柳澤４号橋	中８９号線	不明	3.5	4.4	1	I			○						○													—
15190	柳澤５号橋	中９０号線	不明	3.5	4.4	1	II			○						○												修繕	5百万円
15191	新木野１号橋	中９２号線	不明	3.0	4.3	1	I				○					○													—
15192	長瀬洞１号橋	中９９号線	不明	2.6	3.1	1	I					○					○												—
15193	藤塚橋	中１００号線	不明	3.4	5.8	1	I				○					○													—
15194	新木野３号橋	中１０４号線	不明	4.7	4.4	1	I				○					○													—
15195	大西２号橋	中１１５号線	2012	9.4	1.9	1	I				○					○													—
15196	社宮司１号橋	中１３８号線	不明	3.2	4.0	1	I					○					○												—
15197	社宮司２号橋	中１４０号線	不明	2.3	5.8	1	I					○					○												—
15198	西田橋	中１６５号線	1989	2.7	4.8	1	I				○					○													—
15199	上地円１号橋	中１７１号線	不明	6.1	3.6	1	I				○					○													—
15200	中地円橋	中１７３号線	不明	9.8	5.6	1	I				○					○													—
15201	出合橋	中１７７号線	不明	6.9	3.3	1	II	○					○															修繕	4百万円
15202	一本木橋	中２４４号線	不明	2.3	6.0	1	I					○					○												—
15203	奥田橋	中１８６号線	不明	2.9	3.6	1	I					○					○												—
15204	北屋敷４号橋	中１９２号線	不明	3.2	15.5	1	I					○					○												—
15205	東洞１号橋	中１９３号線	不明	3.3	3.4	1	II					○					○											修繕	4百万円
15206	北屋敷３号橋	中２７６号線	不明	3.3	5.0	1	I					○					○												—
15207	大王寺１号橋	中１９５号線	不明	2.1	4.1	1	I					○					○												—
15208	東洞２号橋	中１９５号線	不明	2.8	4.0	1	I					○					○												—
15209	大王寺２号橋	中２００号線	不明	3.1	4.5	1	I				○					○													—
15210	大王寺３号橋	中２０１号線	不明	4.5	4.8	1	I				○					○													—
15211	北屋敷１号橋	中２０３号線	不明	3.2	9.0	1	I					○					○												—
15212	北屋敷２号橋	中２０４号線	不明	3.1	7.0	1	II					○					○											修繕	5百万円
15213	ヒラン橋	中２５３号線	1970	4.0	4.2	1	II				○					○												修繕	4百万円
15214	涯下橋	柳澤－青木線	不明	12.3	7.9	1	I				○					○													—
15215	栗ヶ坪橋	笠田－杉ヶ洞線	不明	5.8	3.5	1	I			○					○														—
15216	欠ノ下橋	笠田－杉ヶ洞線	不明	5.0	4.2	1	I			○					○														—
15217	土橋	伏見１号線	不明	9.5	7.2	1	I			○					○														—
15218	階子田１号橋	伏見１９２号線	不明	7.8	13.3	1	II			○					○													修繕	6百万円
15219	大坪橋	伏見３号線	不明	3.3	10.5	1	I					○					○												—
15220	白山橋	伏見２２号線	不明	7.2	3.8	1	II			○					○													修繕	5百万円
15221	赤根橋	伏見２４号線	不明	8.2	3.8	1	II			○					○													修繕	6百万円

１５m未満橋梁の個別施設計画（計画期間は令和5年度より10年間）

令和７年７月更新

橋梁ID	橋梁名	町道路線名	架設年度	橋長（m）	幅員（m）	径間	健全性判定	法定点検計画										補修計画（調査設計は○、施工は●で表示）										対策内容	対策費用
								R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14		
15222	下洞橋	伏見２７号線	不明	4.7	3.7	1	II			○					○													修繕	5百万円
15223	坂本橋	伏見３０号線	不明	9.2	3.4	1	I			○					○														―
15224	金ヶ崎橋	伏見３９号線	2003	12.5	5.2	1	I			○					○														―
15225	樋角橋	伏見４０号線	不明	9.4	3.7	1	I			○					○														―
15226	東坂下１号橋	伏見６９号線	不明	2.2	7.5	1	II			○					○													修繕	5百万円
15227	横枕橋	伏見７３号線	不明	9.7	4.8	1	I			○					○														―
15228	岩崎２号橋	伏見７７号線	不明	3.9	6.0	1	I			○					○														―
15229	東柿外戸橋	伏見７８号線	不明	2.6	9.0	1	I			○					○														―
15231	大洞１号橋	伏見２００号線	不明	4.0	3.9	1	I					○					○												―
15232	階子田２号橋	伏見１９２号線	不明	7.0	10.2	1	I					○					○												―
	15m未満2m以上	136橋						28	26	43	14	26	27	26	27	29	27												
